

المقاول		وكالة التعمير والمشاريع		الاستشاري	
شركة طرق الرياض للمقاولات		الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف		مكتب رمك للاستشارات الهندسية	
تقديم جديد ☒		مشروع تلال الغروب			
إعادة تقديم ☐		استمارة طلب تسليم رقم		الاعمال المساحية والترايبه	

اسم الحي : الأمير فواز
رقم المخطط : BLOCK03 رقم الشارع : ROAD 03
استلام الطبقة : 1ST LAYER SUBBASE من محطة رقم : 000+0 إلى محطة رقم : 150+0

أعمال أخرى : ☐
مهندس الموقع :
المراقب ☐ المساح ☐ المختبر ☐
توقيع المهندس المشرف : التاريخ : 2/11/2024 0:00

مرئيات المراقبة : ☒ جاهز ☐ غير جاهز
ملاحظات :

نتيجة تدقيق المساحة : من المحطة : 0+0 إلى المحطة : 150+0
مرفقات : ☐ القطع الطولي ☐ القطع العرضي ☐ أخرى ☐
متطابق ☒ غير متطابق ☐
ملاحظات : التوقيع : التاريخ : / /

من محطة : إلى محطة :
توقيع المساح : التاريخ : / /

نتيجة تدقيق المواد : تصنيف المواد : مرفق ☐ قيمه البركتور : الرطوبة المثلي :
غير مرفق ☐
رقم الاختبار : رقم المحطة : نوع المادة : نسبة الدك : نسبة الرطوبة : النتيجة : ملاحظات :
النتيجة : ناجح ☐ راسب ☐ التوقيع : التاريخ : / /

ملاحظات : تعليمات المهندس الاستشاري :
موافق ☒ غير موافق ☐
التوقيع : التاريخ : / /
تم الاستلام : مندوب المقاول : التوقيع : التاريخ : / /




مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

أمانة
جدة



شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING

المقاول :- شركة طرق الرياض للمقاولات				الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف إدارة تنفيذ الطرق				الاستشاري :- مكتب رمك للاستشارات الهندسية			
تقرير إستلام طبقة ردم											
ROAD-B03-3		رقم المشروع :-		تأريخ الخروب		إسم المشروع :-					
264.28M		رقم المخطط :-		BLOCK03		رقم المخطط :-					
18		عرض الشارع :-		1ST LAYER		رقم الطبقة :-					
		WIDHT-R		9.000		LAYAER THICKNESS				0.150	
		WIDHT-L		9.000		DEOTH FROM TOP SUB.G				0.000	
PVI	Station	Easting	Northing	L		C.L	R		CL width from L	CL width from R	
SLOPE				1.50%	-1.50%	0.00%	-1.50%	1.50%			
				-5.500	-3.500	0.000	3.500	5.500			
1	0	530077.8212	2369337.831	58.180	58.098	58.150	58.098	58.180	9.000	9.000	
2	12.5	530089.3619	2369333.028	58.338	58.256	58.308	58.256	58.338	9.000	9.000	
3	25	530100.9026	2369328.226	58.496	58.414	58.466	58.414	58.496	9.000	9.000	
4	37.5	530112.4433	2369323.424	58.653	58.571	58.623	58.571	58.653	9.000	9.000	
5	50	530123.984	2369318.621	58.807	58.725	58.777	58.725	58.807	9.000	9.000	
6	62.5	530135.5247	2369313.819	58.961	58.879	58.931	58.879	58.961	9.000	9.000	
7	75	530147.0654	2369309.017	59.116	59.034	59.086	59.034	59.116	9.000	9.000	
8	87.5	530158.606	2369304.214	59.270	59.188	59.240	59.188	59.270	9.000	9.000	
9	100	530170.1467	2369299.412	59.425	59.343	59.395	59.343	59.425	9.000	9.000	
10	112.5	530181.6874	2369294.61	59.579	59.497	59.549	59.497	59.579	9.000	9.000	
11	125	530193.2281	2369289.807	59.734	59.652	59.704	59.652	59.734	9.000	9.000	
12	137.5	530204.7688	2369285.005	59.889	59.807	59.859	59.807	59.889	9.000	9.000	
13	150	530216.3095	2369280.203	60.043	59.961	60.013	59.961	60.043	9.000	9.000	
الاستشاري				المقاول							
مكتب رمك للاستشارات الهندسية				شركة طرق الرياض للمقاولات							
الإسم :- م / فاضل محمد				الإسم :-							
التوقيع :-				التوقيع :-							
التاريخ :-				التاريخ :-							



In-place Density and Water Content of Soil by EDG

Project	تنفيذ اعمال البنية التحتية	Report No.	PRO-240463.71
Client	شركة طرق الرياض للمقاولات	Testing Date	02-11-24
Location	جدة - حي الامير فواز - مخطط تلال الغروب	Sample By	Sumon
Test Apparatus	WINTESTING EDG-WS	Ref.	ASTM D 7698

Layer	1st Layer of Sub Base
Location	Block 03 Road 03 Sta. 0+000 to Sta. 0+150

FIELD TEST RESULTS						
TEST NO.	LOCATION	wet density	dry density	water content	compaction	percent req.
		kg/m ³	kg/m ³	%	%	%
1	0+020	2.369	2.202	7.6	100.5	
2	0+060	2.380	2.206	7.9	100.7	
3	0+105	2.352	2.187	7.5	99.8	
4	0+140	2.361	2.196	7.5	100.2	

M.D.D = 2.191 kg/m ³
O.M.C = 7.52 %

The lab is responsible of all information provided in this report , unless this information is given by the client.

* These results are for the tested materials and tested locations only.

The lab is not responsible of sampling, sample is tested as received.

The report will not be re issued until authorized by the lab management, Lab is not responsible about the sample after two weeks of the test reoprt date.

Checked by


[Signature]



Approved by

[Signature]



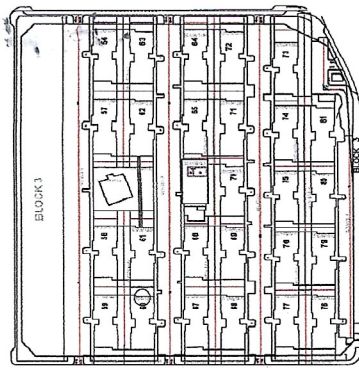

اتجاه تصريف المياه	
الارض الطبيعية	
الخط التصميمي	
اسفلت قائم	
المسكة المربوعة السعودية	
أمانة مدينة جدة	
إدارة أمانة الطرق وبنية	
المشروع/الطريق	
المالك/	وزارة الاسكان



المطور/	شركة ساني العمرية
المستشار العام/	سني العمرية Sani Al-Amriyah Co.

المستشاري/	مكتب ريك للاستشارات الهندسية Rik Engineering & Consulting Rik Engineering & Consulting Rik Engineering & Consulting
------------	--

المشاور/	شركة طريق الرياض للدراسات
----------	---------------------------

تصميم الطرق لمشروع طال الغروب	
بجى الأمير فواز شمال - مدينة جدة	
BLOCK-03	

مسج	
تصميم	
تأليف	
تاريخ	
مدير المرحمة	

معلومات عامة	معلومات الدراسات والتصاميم
NO. 3	GENERAL LAYOUT PLAN
مقياس الرسم	1:350

